Projektliste Hochbau
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lörrach

Nr.	Vorgangsname	Ziel- Prio-Raster	Anfang	Ende	Dauer	Förder- fähig (ja/nein)	Beschlusslage	Aktuell angenommene Kosten in €	GrobKo, KoSchä, KoBe, KoFo, KoFe	Projektleitung und Projektgröße
1	**Projekte in Bearbeitung:**		**Fre 15.04.16**	**Fre 03.02.23**	**1776 Tage**					
147	**Fridolinschule, Masterplan**	**63**	**Fre 06.04.18**	**Don 05.12.19**	**434 Tage**	**ja**				**PL8 ?% (1)**
148	GRUNDLAGENERMITTLUNG		**Fre 06.04.18**	**Don 05.12.19**	**434 Tage**					
149	Raumprogramm		Fre 06.04.18	Fre 11.05.18	5 Wochen					
150	VgV Verfahren		Mon 14.05.18	Mon 06.08.18	12 Wochen					
151	Voruntersuchungen		Die 07.08.18	Die 14.05.19	40 Wochen					
152	Bestandsaufnahme, Bauteilöffnungen		Mit 15.05.19	Mit 21.08.19	14 Wochen					
153	Vorentwurfsplanungen		Don 22.08.19	Don 05.12.19	15 Wochen					
155	**Beginn 2020:**		**Die 01.01.19**	**Don 21.05.26**	**1928 Tage**					
156	**Fridolinschule - Ertüchtigung Neumattschule und Auslagerung**	**63**	**Fre 24.04.20**	**Fre 20.08.21**	**346 Tage**	**ja**		**500.000**	**GrobKo**	**PL1 75% (2)**
157	PLANUNG		**Fre 24.04.20**	**Don 01.04.21**	**245 Tage**					
158	Vorentwurfsplanung		Fre 24.04.20	Fre 03.07.20	10 Wochen					
159	Entwurfsplanung und Kostenberechnung		Fre 03.07.20	Don 27.08.20	8 Wochen					
160	Genehmigung Gemeinderat		Fre 18.09.20	Don 22.10.20	5 Wochen					
161	Genehmigungsplanung		Fre 23.10.20	Don 12.11.20	3 Wochen					
162	Baugenehmigungsverfahren		Fre 13.11.20	Don 21.01.21	10 Wochen					
163	Ausführungsplanung		Fre 23.10.20	Don 19.11.20	4 Wochen					
164	Ausschreibungsphase (Paket 1)		Fre 22.01.21	Don 11.03.21	7 Wochen					
165	Reserve (Ausschreibungen)		Fre 12.03.21	Don 01.04.21	3 Wochen					
166	BAUZEIT		Fre 02.04.21	Don 15.07.21	15 Wochen					
167	Umzug (Sommerferien 2021)		Mon 09.08.21	Fre 20.08.21	2 Wochen					
168	Projektnachbereitung		Mon 23.08.21	Fre 29.10.21	10 Wochen					
170	**Fridolinschule, Sanierung Schulhäuser**	**63**	**Fre 06.12.19**	**Fre 25.08.23**	**971 Tage**	**ja**		**7.900.000**	**KoBe**	**PL10 100% (2)**
171	PLANUNG		Fre 06.12.19	Don 07.10.21	480 Tage					
172	Entwurfsplanung und Kostenberechnung		Fre 06.12.19	Fre 29.05.20	25 Wochen					
173	Genehmigung im Gemeinderat		Fre 18.09.20	Don 22.10.20	5 Wochen					
174	Genehmigungsplanung		Fre 23.10.20	Don 26.11.20	5 Wochen					
175	Baugenehmigungsverfahren (inkl. Denkmalschutz)		Fre 27.11.20	Don 01.04.21	18 Wochen					
176	Ausführungsplanung		Fre 23.10.20	Don 20.05.21	30 Wochen					
177	Ausschreibungsphase (Paket 1)		Fre 02.04.21	Don 02.09.21	22 Wochen					
178	Reserve (Ausschreibungen)		Fre 03.09.21	Don 07.10.21	5 Wochen					
179	BAUZEIT		Fre 08.10.21	Don 06.04.23	78 Wochen					
180	Umzug nach Bauzeit (Sommerferien)		Mon 31.07.23	Fre 25.08.23	4 Wochen					
181	Projektnachbereitung		Fre 07.04.23	Don 24.08.23	20 Wochen					

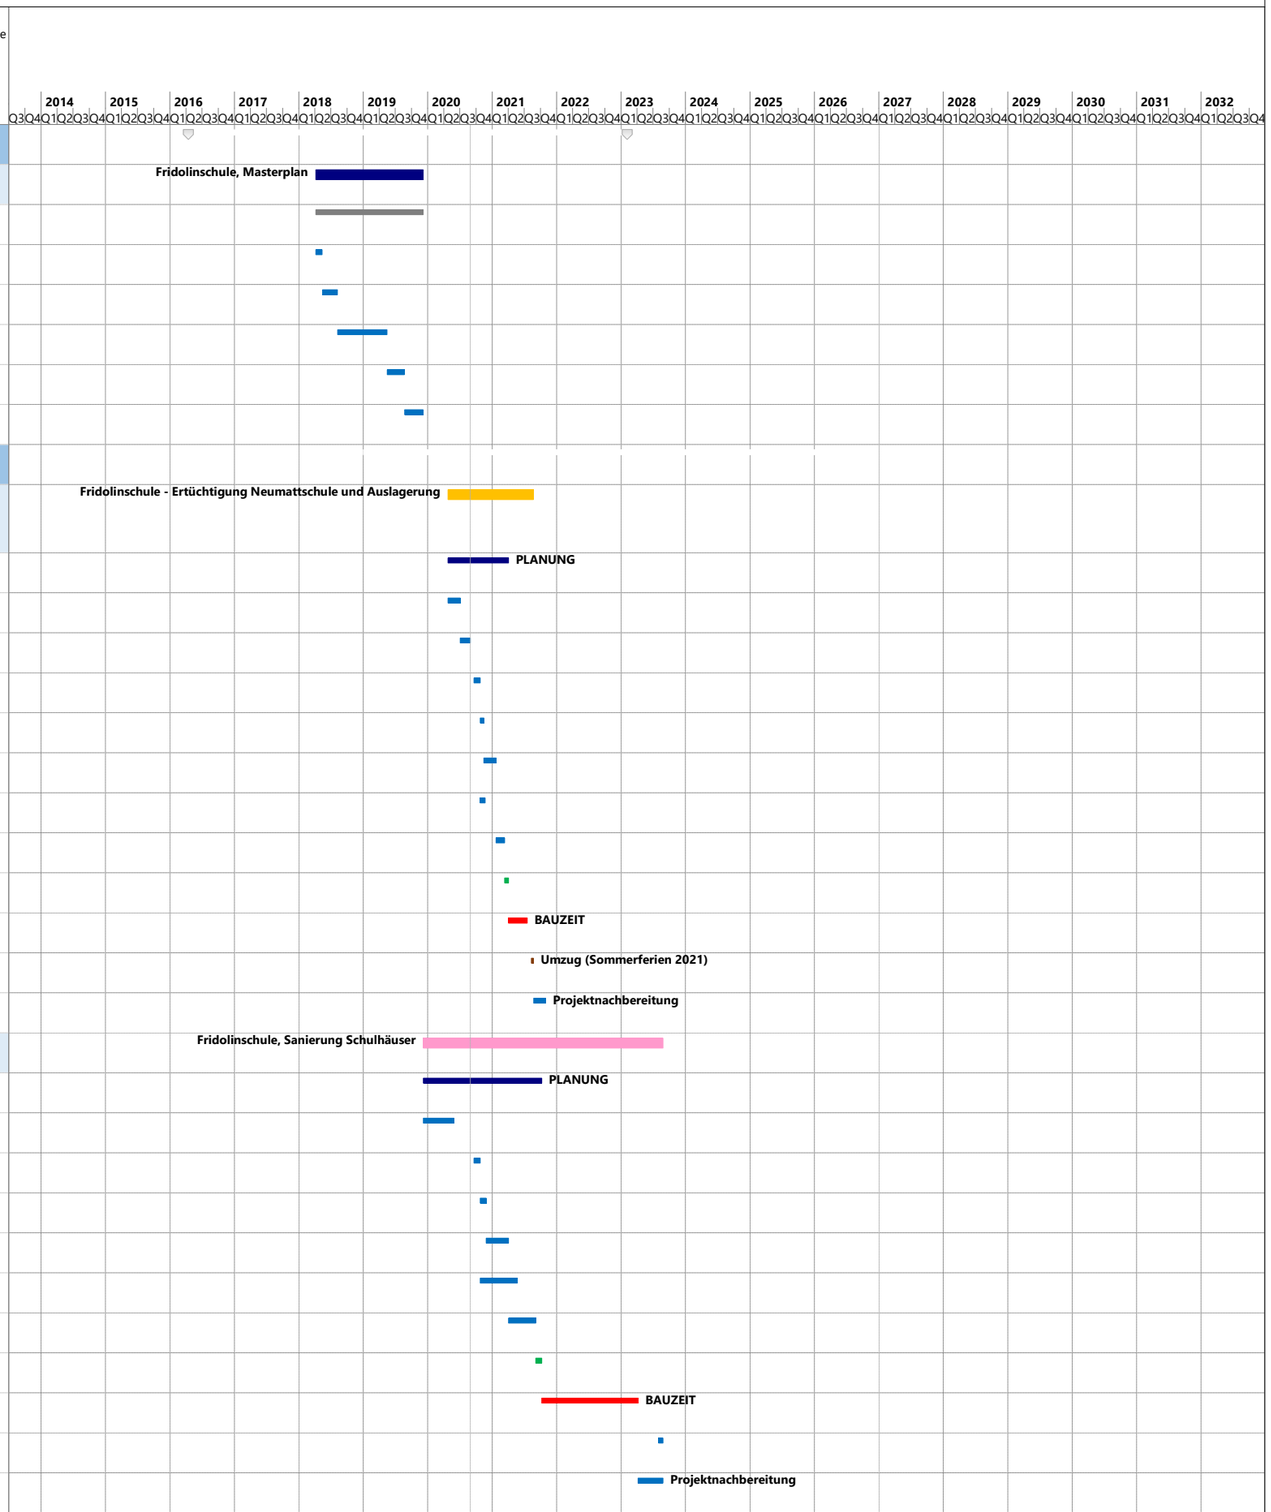

Projektliste Hochbau
Grundstücks- und Gebäudemanagement
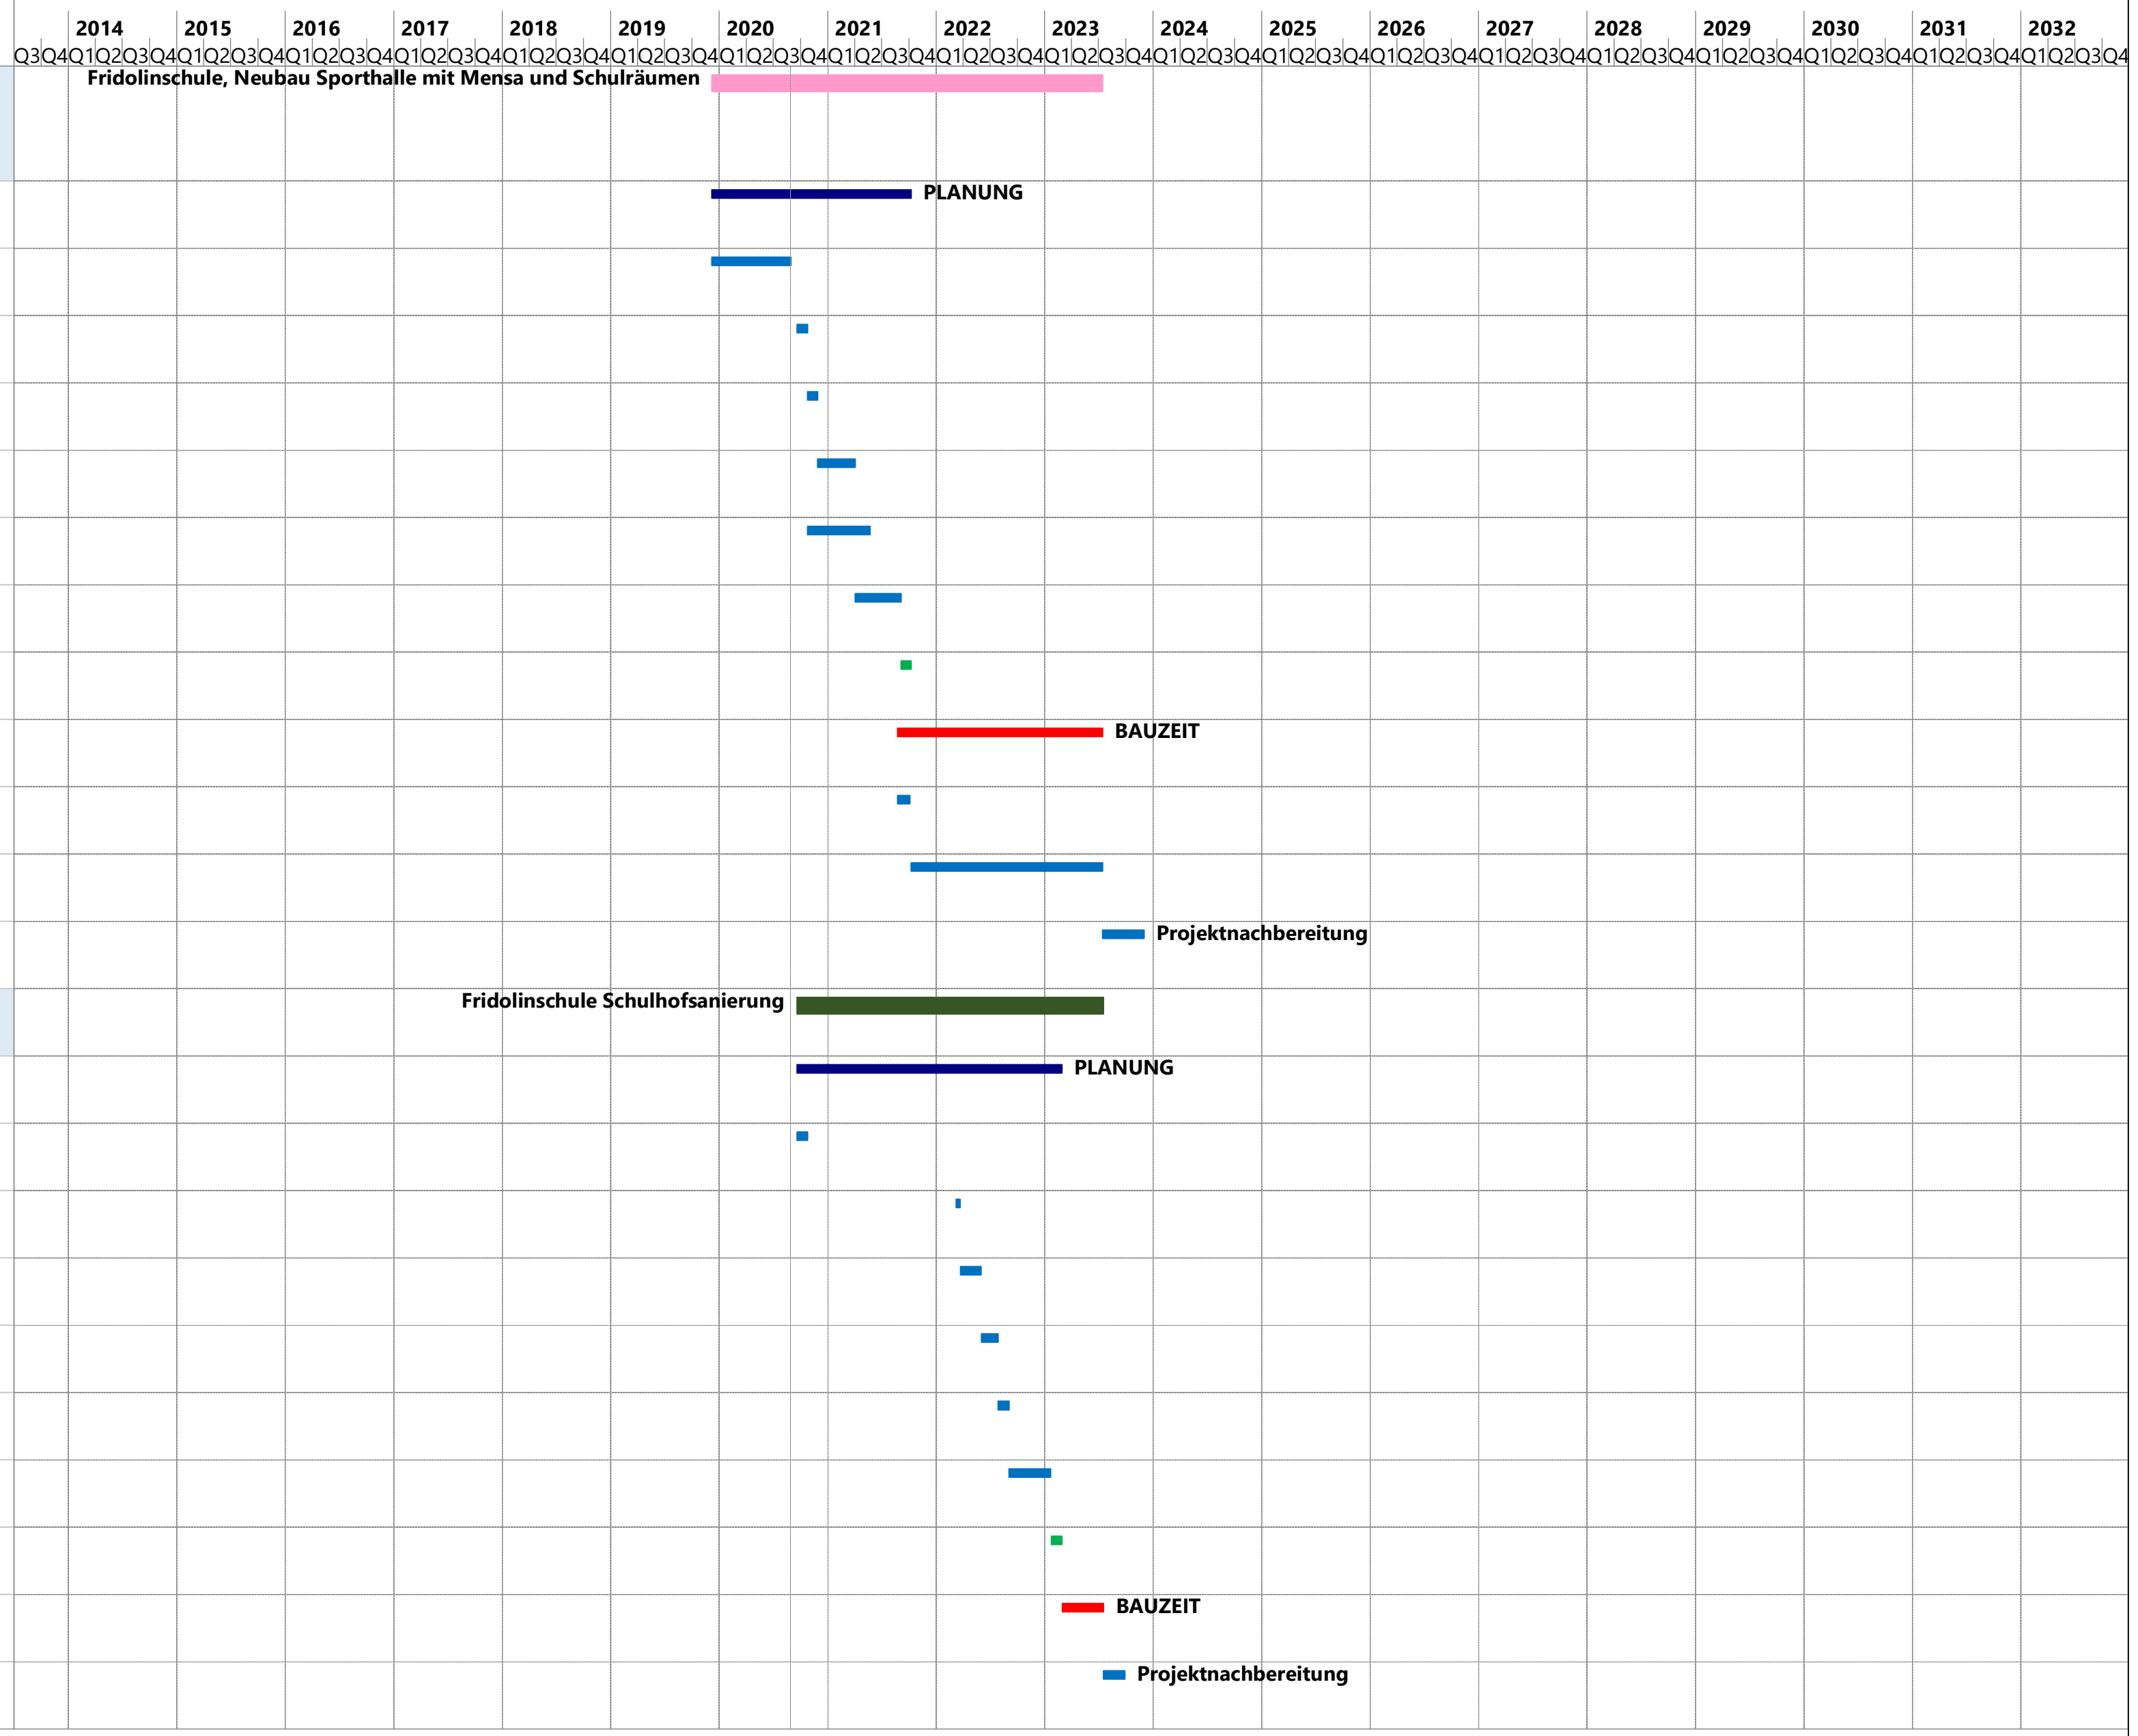
Nr.	Vorgangsname	Ziel- Prio-Raster	Anfang	Ende	Dauer	Förder- fähig (ja/nein)	Beschlusslage	Aktuell angenommene Kosten in €	GrobKo, KoSchä, KoBe, KoFo, KoFe	Projektleitung und Projektgröße
183	**Fridolinschule, Neubau Sporthalle mit Mensa und Schulräumen**	**63**	**Fre 06.12.19**	**Don 13.07.23**	**940 Tage**	**ja**		**8.800.000**	**KoSchä**	**PL10 100% (2)**
184	PLANUNG		Fre 06.12.19	Don 07.10.21	480 Tage					
185	Entwurfsplanung und Kostenberechnung		Fre 06.12.19	Fre 28.08.20	38 Wochen					
186	Genehmigung Gemeinderat		Fre 18.09.20	Don 22.10.20	5 Wochen					
187	Genehmigungsplanung		Fre 23.10.20	Don 26.11.20	5 Wochen					
188	Baugenehmigungsverfahren (inkl. Denkmalschutz)		Fre 27.11.20	Don 01.04.21	18 Wochen					
189	Ausführungsplanung		Fre 23.10.20	Don 20.05.21	30 Wochen					
190	Ausschreibungsphase (Paket 1)		Fre 02.04.21	Don 02.09.21	22 Wochen					
191	Reserve (Ausschreibungen)		Fre 03.09.21	Don 07.10.21	5 Wochen					
192	BAUZEIT		Mon 23.08.21	Don 13.07.23	494 Tage					
193	Abbruch		Mon 23.08.21	Fre 01.10.21	6 Wochen					
194	Neubau		Fre 08.10.21	Don 13.07.23	92 Wochen					
195	Projektnachbereitung		Fre 14.07.23	Don 30.11.23	20 Wochen					
197	**Fridolinschule Schulhofsanierung**	**40**	**Fre 18.09.20**	**Mon 17.07.23**	**737 Tage**			**500.000**	**GrobKo**	**PL12 50% (L2)**
198	PLANUNG		Fre 18.09.20	Mon 27.02.23	636 Tage					
199	Maßnahmengenehmigung		Fre 18.09.20	Don 22.10.20	5 Wochen					
200	Vorentwurfsplanung		Mon 07.03.22	Mon 21.03.22	2 Wochen					
201	Entwurfsplanung und Kostenberechnung		Die 22.03.22	Die 31.05.22	10 Wochen					
202	Genehmigung Gemeinderat		Mit 01.06.22	Mit 27.07.22	8 Wochen					
203	Ausführungsplanung		Don 28.07.22	Don 01.09.22	5 Wochen					
204	Ausschreibungsphase (Paket 1)		Fre 02.09.22	Fre 20.01.23	20 Wochen					
205	Reserve (Ausschreibungen)		Mon 23.01.23	Mon 27.02.23	5 Wochen					
206	BAUZEIT		Die 28.02.23	Mon 17.07.23	20 Wochen					
207	Projektnachbereitung		Die 18.07.23	Mon 25.09.23	10 Wochen
